



# Comune di Arquata del Tronto

*" Provincia di ASCOLI PICENO "*

## **PROGETTO ESECUTIVO**

***COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI  
NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE***

---

**ENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARQUATA DEL TRONTO**

---

---

**PROGETTISTA :** Ing. Fioravanti Flavio– studio tec. C.da Castiglioni, 12 di Castignano (AP)

---

---

**ELABORATO:**

**FASI LAVORATIVE E PROGRAMMA LAVORI  
( CRONOPROGRAMMA) .**

---

---

**DATA:** novembre 2014

---

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**  
geom. Mauro Fiori

**IL PROGETTISTA**  
ing. Flavio Fioravanti

---

*Elenco delle fasi lavorative previste per il cantiere CIMITERO COLLE :*

---

1.	<i>allestimento cantiere</i>	<i>gg. 2</i>
2.	<i>demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata);</i>	<i>gg. 4</i>
3.	<i>getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni</i>	<i>gg. 1</i>
4.	<i>casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione;</i>	<i>gg. 3</i>
5.	<i>realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base;</i>	<i>gg. 2</i>
6.	<i>posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.;</i>	<i>gg. 9</i>
7.	<i>armatura e getto tutti livelli dei loculi;</i>	<i>gg. 9</i>
8.	<i>predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da <math>h &gt; 2.00</math> m);</i>	<i>gg. 3</i>
9.	<i>casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura;</i>	<i>gg. 4</i>
10.	<i>posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame;</i>	<i>gg. 2</i>
11.	<i>OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti;</i>	<i>gg. 9</i>
12.	<i>posa cavi elettrici impianto votivo</i>	<i>gg. 2</i>
13.	<i>smontaggio ponteggio;</i>	<i>gg. 1</i>
14.	<i>opere di sistemazione muretti, camminamenti e opere connesse;</i>	<i>gg. 7</i>
15.	<i>smontaggio cantiere.</i>	<i>gg. 2</i>


---

**SOMMANO GIORNI PREVISTI    60 gg**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

## CANTIERE COLLE

Tempo contrattuale: giorni 60

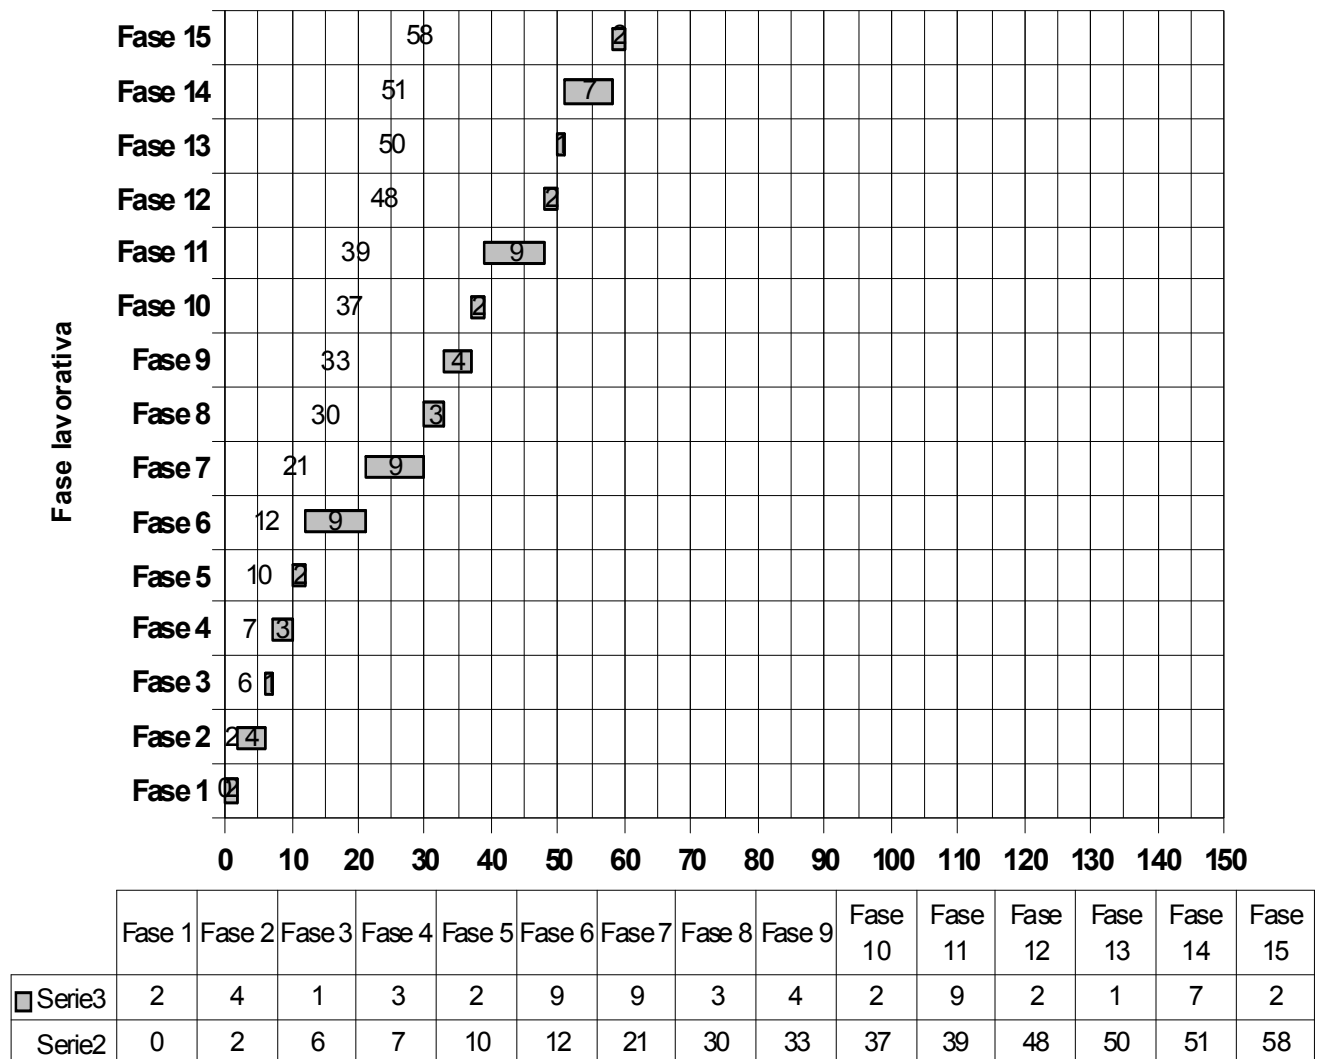

Di seguito viene riportato il cronoprogramma dei lavori così come sopra descritti:

In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Colle si prevede un tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficoltà di operazione e delle variabili condizioni climatiche, di gg. 60 ( mesi due ).

*Elenco delle fasi lavorative previste per il cantiere CIMITERO FAETE :*

**FASI LAVORATIVE BATTERIA LOCULI FAETE**

---

1. allestimento cantiere	gg. 2
2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata);	gg. 4
3. getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni	gg. 1
4. casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione;	gg. 3
5. realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base;	gg. 2
6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.;	gg. 9
7. armatura e getto tutti livelli dei loculi;	gg. 9
8. predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da $h > 2.00$ m);	gg. 3
9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura;	gg. 4
10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame;	gg. 2
11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti;	gg. 9
12. posa cavi elettrici impianto votivo	gg. 2
13. smontaggio ponteggio;	gg. 1
14. opere di sistemazione camminamenti, muro in c.a. e opere connesse;	gg. 7
15. smontaggio cantiere.	gg. 2


---

**SOMMANO GIORNI PREVISTI    60 gg**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

## CANTIERE FAETE

Tempo contrattuale: giorni 60

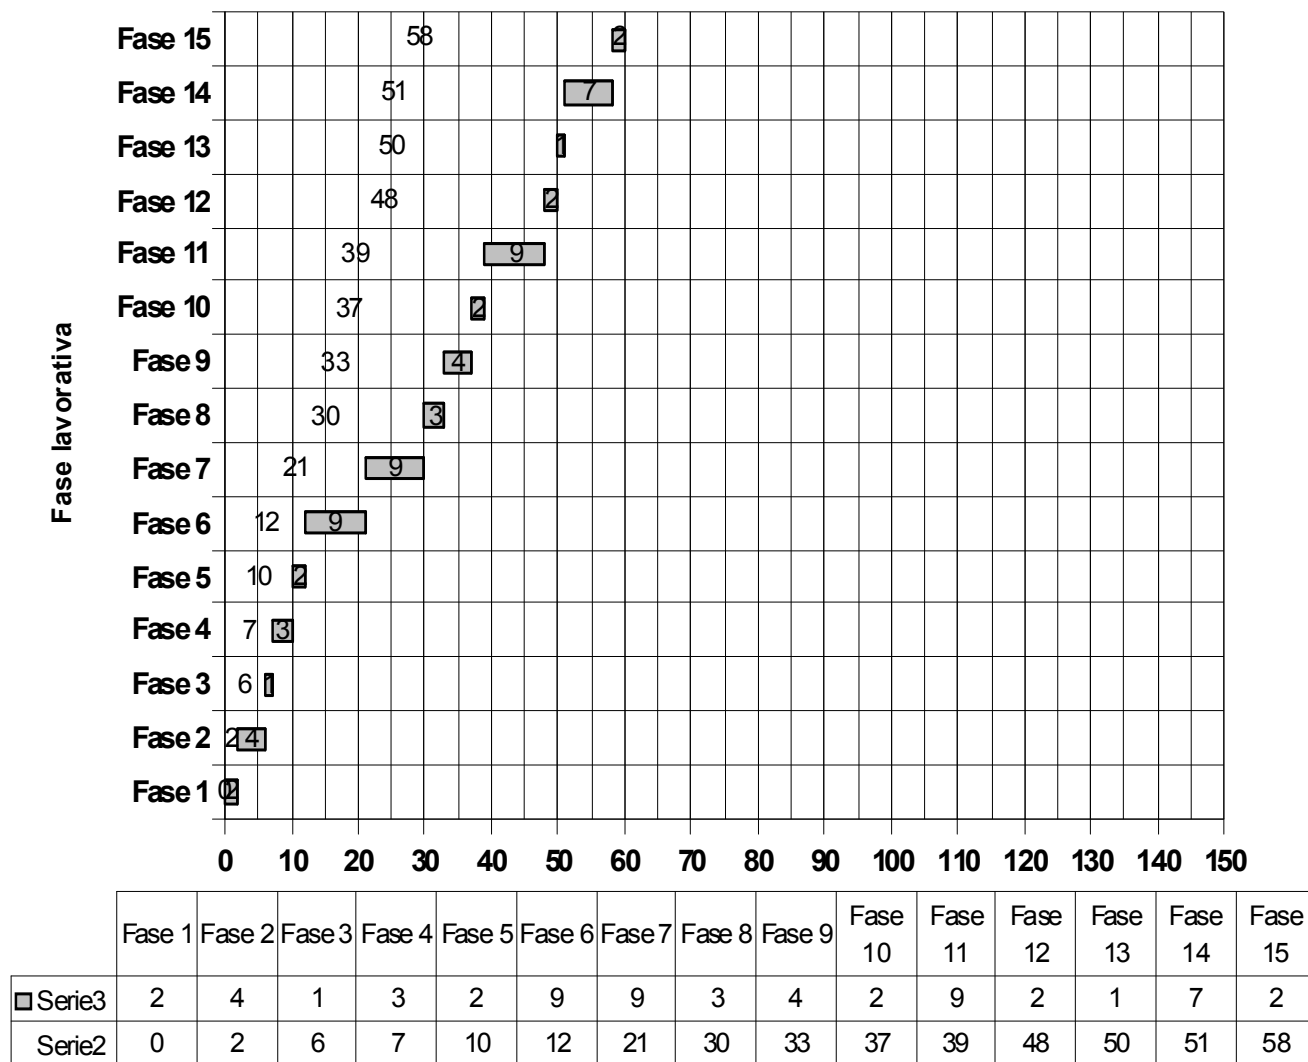

Di seguito viene riportato il cronoprogramma dei lavori così come sopra descritti:  
 In definitiva per i lavori riferiti al solo cantiere del civico cimitero di Faete si prevede un tempo di esecuzione, tenuto conto delle difficoltà di operazione e delle variabili condizioni climatiche, di gg. 60 ( mesi due ).

Pertanto, **complessivamente si prevede un tempo di esecuzione complessivo per i lavori in progetto di centoventi giorni (120gg)** anche tenuto conto delle difficoltà di operazione e delle variabili condizioni climatiche.
