

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Elpidio a mare
Provincia di Fermo

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Realizzazione di un percorso pedonale
COMMITTENTE: Comune di St' Elpidio a Mare
CANTIERE: Via Fonte di Mare

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Ing. Giovanni Verdicchio

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Arch. Monia Illuminati

Ing. Verdicchio Giovanni
Via Oberdan 7
62010 Mogliano (MC)
Tel/Fax 0733-556343 – Cell. 336-452197

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (baracca di cantiere)	1	E	2	5		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	6		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	7		
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE						
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	5	12		
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	3	15		
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	16		
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	19		
Realizzazione di pali trivellati	1	E	9	28		
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	8	36		
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	8	44		
Posa di corrugati per raccolta acqua piovana	1	E	2	46		
Rinterro di scavo	1	E	3	49		
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	51		
	1	E	1	52		
	1	E	3	55		
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	40		
Realizzazione di marciapiedi	1	E	22	62		
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	66		
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	5	71		
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	3	74		
Posa di segnali stradali	1	E	1	75		
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	77		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA : carreggiata stradale lungo la SP Fonte di Mare

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA PRIGRESSIVA giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di lavoro

Nome attività	Durata	ettimana -1Settimana 1									
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 g										
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z1									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (bara	2 g	Z1									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1									
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1									
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE	66 g										
Risezionamento del profilo del terreno	5 g	Z1									
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g										
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g										
Scavo a sezione obbligata	3 g										
Realizzazione di pali trivellati	9 g										
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	8 g										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	8 g										
Posa di corrugati per raccolta acqua piovana	2 g										
Rinterro di scavo	3 g										
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	6 g										
Formazione di fondazione stradale	5 g										
Realizzazione di marciapiedi	22 g										
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g										
Posa di ringhiere e parapetti	5 g										
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g										
Posa di segnali stradali	1 g										
Smobilizzo del cantiere	2 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

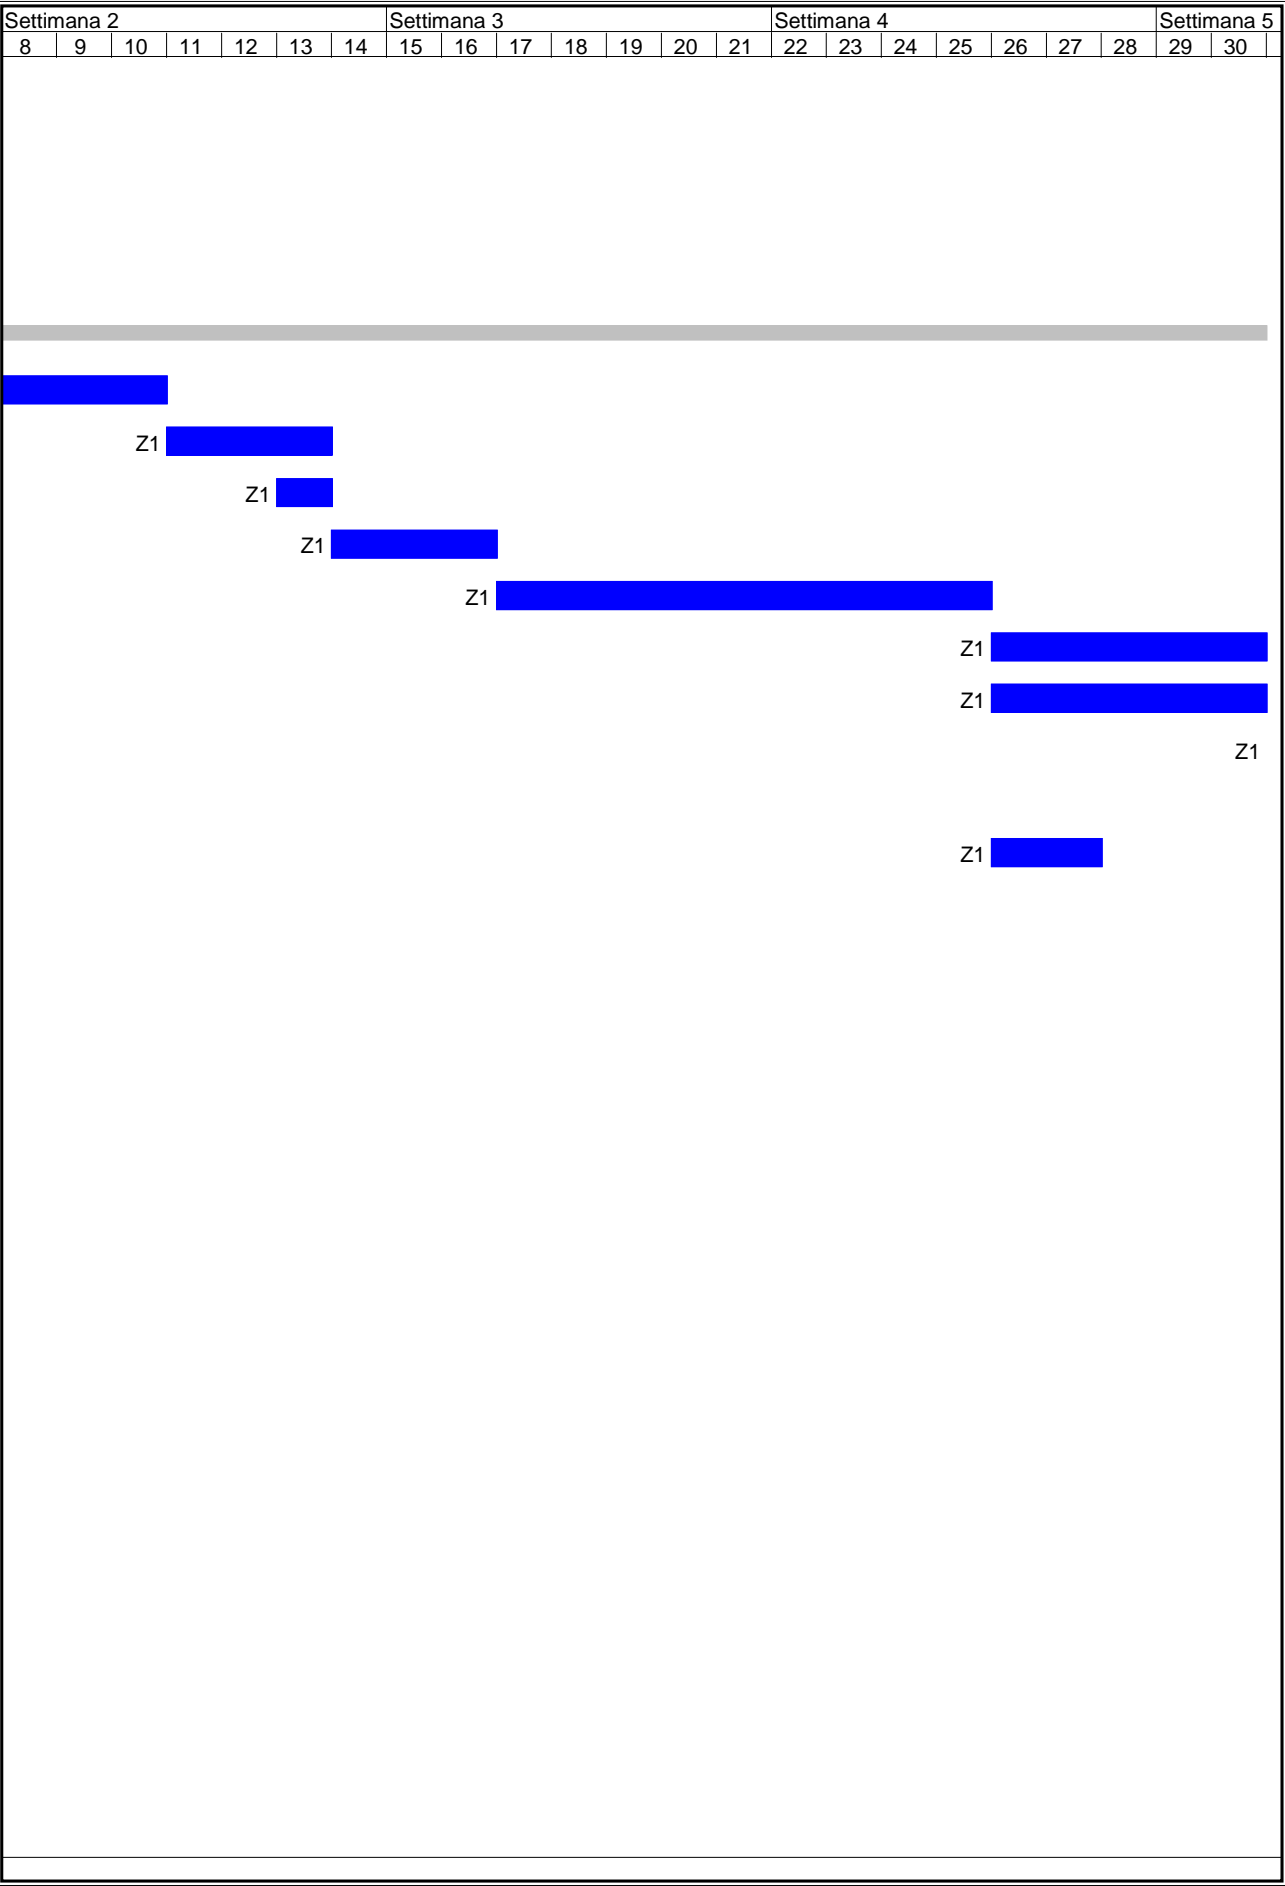

[illegible]

