

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST PINETA
CON REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: 16.02.2016

REV 00

DESCRIZIONE:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:

.....
ING. FRANCESCO TROVARELLI

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

.....
ARCH. CATERINA MARGIONE

ALLEGATO "A"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di consolidamento versante ovest pineta con realizzazione campo polivalente

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.

CANTIERE: Piazza Marconi, Monsampolo del Tronto (AP)

Ascoli Piceno, 15/02/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Trovarelli Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro tempore Caioni Pierluigi)

Ingegnere Trovarelli Francesco

via Alessandria 12
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3	1	2	2	11/04/2016	12/04/2016
Protezione delle linee elettriche aeree						
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	1	1	1	12/04/2016	12/04/2016
INTERVENTO 1						
Muro di monte						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	13/04/2016	13/04/2016
Protezione delle pareti di scavo	1	1	2	2	14/04/2016	15/04/2016
Perforazioni per pali trivellati	1	1	5	5	18/04/2016	22/04/2016
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	1	5	5	18/04/2016	22/04/2016
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	1	5	5	18/04/2016	22/04/2016
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	1	19	25	26/04/2016	20/05/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	1	19	25	26/04/2016	20/05/2016
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	1	19	25	26/04/2016	20/05/2016
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	1	1	1	23/05/2016	23/05/2016
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	1	1	1	24/05/2016	24/05/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	25/05/2016	25/05/2016
Realizzazione di murature in elevazione	1	1	9	14	26/05/2016	08/06/2016
Posa di ringhiere e parapetti	1	1	2	2	09/06/2016	10/06/2016
Muro di valle						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	26/04/2016	26/04/2016
Perforazioni per pali trivellati	1	1	4	6	27/04/2016	02/05/2016
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	1	4	6	27/04/2016	02/05/2016
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	1	4	6	27/04/2016	02/05/2016
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	1	14	18	03/05/2016	20/05/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	1	14	18	03/05/2016	20/05/2016

Tabella Analitica Gantt

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	1	14	18	03/05/2016	20/05/2016
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	1	1	1	23/05/2016	23/05/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	24/05/2016	24/05/2016
Lavori di sistemazione area						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	8	13	25/05/2016	06/06/2016
Posa di geostuoia	1	1	8	13	25/05/2016	06/06/2016
Messa a dimora di talee e piantine	1	1	8	13	25/05/2016	06/06/2016
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici	1	1	8	13	25/05/2016	06/06/2016
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	1	1	1	07/06/2016	07/06/2016
INTERVENTO 2						
Rimozione di pavimento in pietra	2	1	3	3	08/06/2016	10/06/2016
Rimozione di massetto	2	1	3	3	08/06/2016	10/06/2016
Scavo a sezione ristretta	2	1	3	3	08/06/2016	10/06/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2	1	6	8	13/06/2016	20/06/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2	1	6	8	13/06/2016	20/06/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2	1	6	8	13/06/2016	20/06/2016
Realizzazione di vespaio areato in pietrame	2	1	1	1	21/06/2016	21/06/2016
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	1	2	2	22/06/2016	23/06/2016
Posa di pavimenti per esterni in masselli	2	1	3	5	24/06/2016	28/06/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	1	1	1	29/06/2016	29/06/2016
Riprofilatura del terreno	2	1	2	2	30/06/2016	01/07/2016
Messa a dimora di talee e piantine	2	1	4	4	04/07/2016	07/07/2016
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	3	1	1	1	08/07/2016	08/07/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = INTERVENTO 1

2) = INTERVENTO 2

3) = LOGISTICA


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

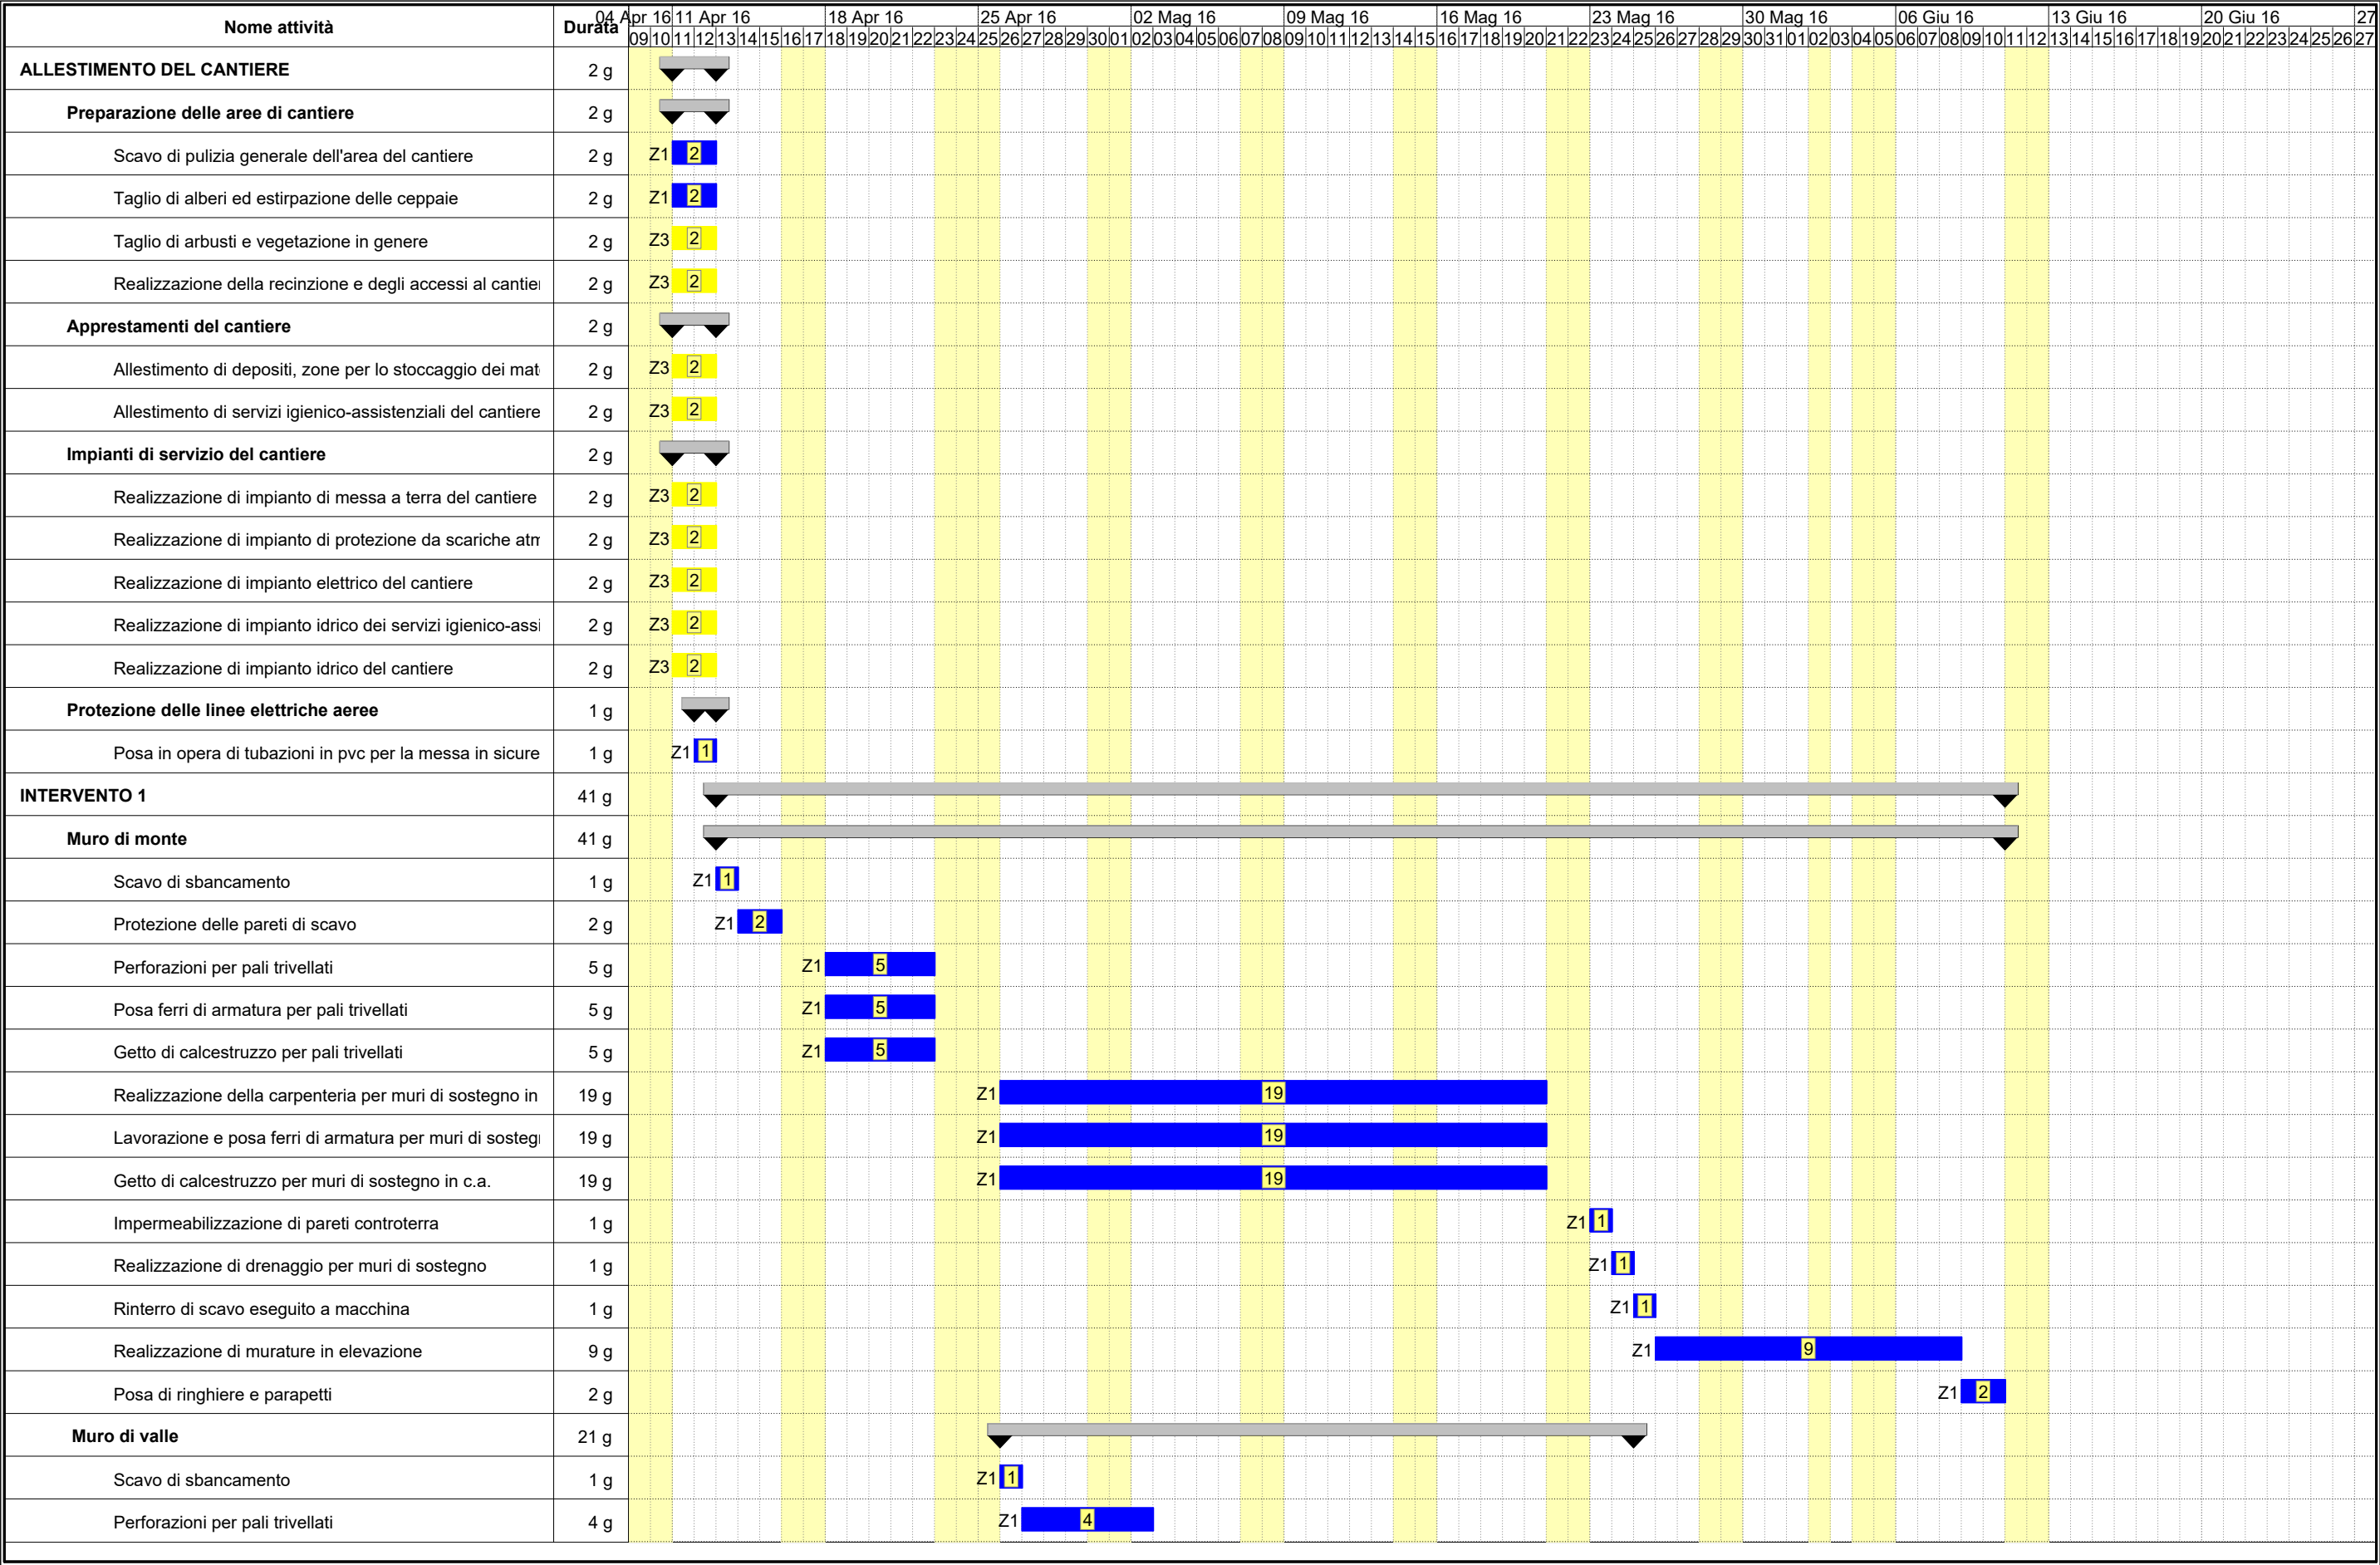

Nome attività	Durata	04 Apr 16			11 Apr 16			18 Apr 16			25 Apr 16			02 Mag 16			09 Mag 16			16 Mag 16			23 Mag 16			30 Mag 16			06 Giu 16			13 Giu 16			20 Giu 16			27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Posa ferri di armatura per pali trivellati	4 g													Z1				4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

