



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di Fermo)

5° Settore – Servizi Tecnici del Territorio

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI

PROGETTO ESECUTIVO

(Art.93 – D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA


Il Progettista
Arch. Sauro Censi

Collaboratore
Geom. Samuele Mandolesi

Il Dirigente del V° Settore
Ing. Francesca Claretti

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
1		Installazione cantiere Viale Cavallotti lato ovest e testate P.za Matteotti e segnaletica	2
2		Demolizione marciapiedi e zanelle	6
3		Sistemazione in quota pozzetti e scavi per sottoservizi	5
4		Pulizia e disostruzione fosso Vicolo Cialdini	4
5		Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi	4
6		Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi	4
7		Scavo e posa in opera canalette raccolta acque P.za Matteotti e collegamento rete di smaltimento	6
8		Preparazione e getto solette cls marciapiedi via Cavallotti lato ovest e testate p.za Matteotti	5
9		Installazione cantiere Viale Cavallotti lato est e demolizione	2
10		Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione marciapiedi Via Cavallotti lato est	3
11		Pavimentazione porfido marciapiedi Via Cavallotti lato est e testate P.za Matteotti e posa chiusini	15
12		Pavimentazione porfido Via Cavallotti lato est e posa chiusini	6
13		Recinzione cantiere centro Piazza e segnaletica	2
14		Scavo di sbancamento p.za Matteotti e scavo plinti p.i.	6
15		Scavi e posa in opera pozzetti e tubazioni sottoservizi	5
16		Preparazione e livellamento con misto granulometrico fondazione stradale	4
17		Scavo e posa in opera cordolo travertino delimitazione piazza	6
18		Preparazione e getto soletta p.za Matteotti e Via Verdi e plinti p.i.	5
20		Scavo aiuole P.za Matteotti lato est e posa in opera cordolo delimitazione	3
21		Preparazione e realizzo massetto delle pendenze e posa tubazione e controcasce led	6
22		Pavimentazione a cubetti Via Verdi	7
23		Pavimentazione a lastre e listelli P.za Matteotti	32
24		Fresatura manto bituminoso Via Crispi e Cavallotti	2
25		Realizzazione nuovo tappetino di usura	1
26		Realizzazione stampo su tappetino di usura	3
27		Rimozione recinzioni e segnaletica temporanea	3
28		Pulizia aree.	3
29			

DURATA (gg)

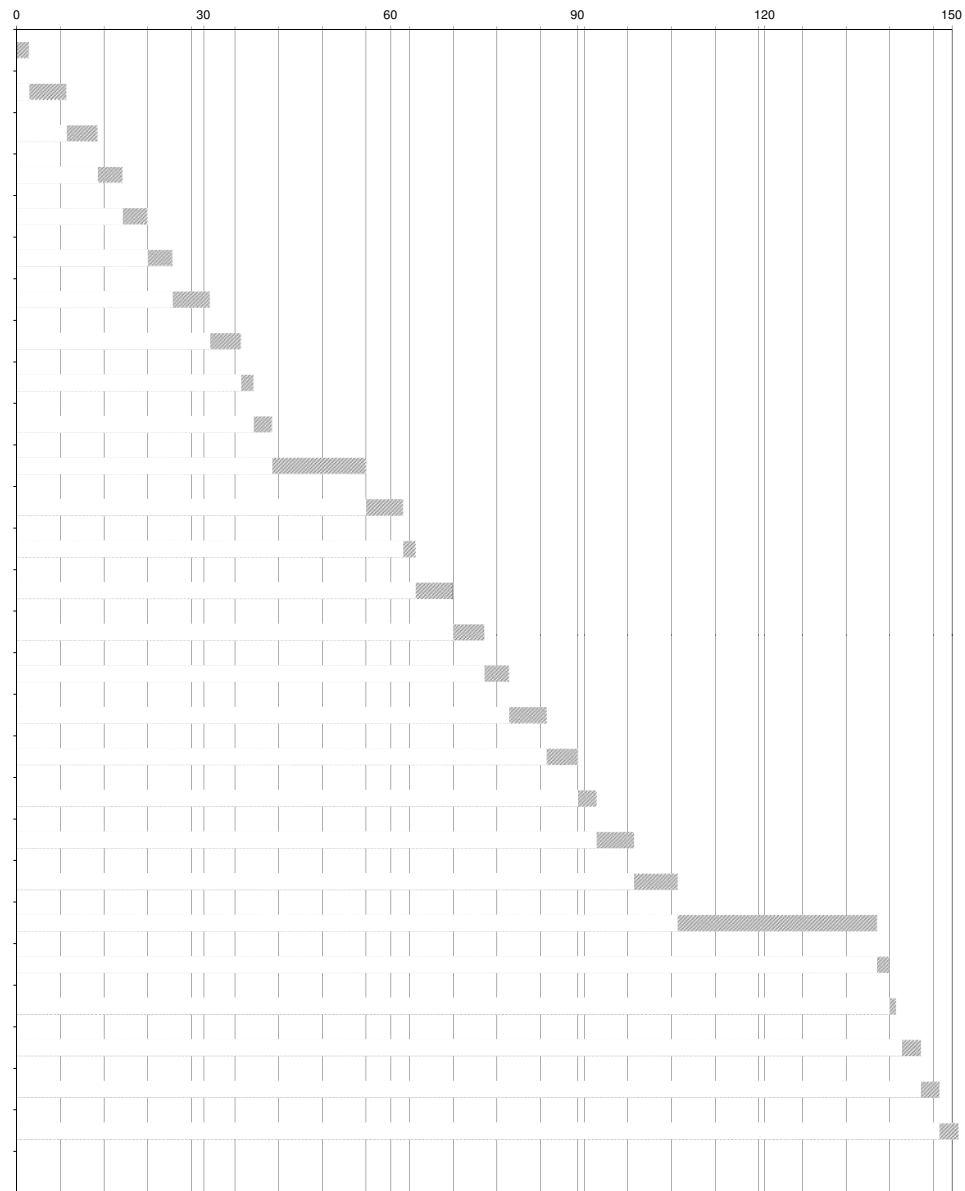

TC

150

giorni lavorativi
